

**Отчет генерального директора Общества
«О выполнении в 2019 году производственных программ, целевых программ
повышения надежности и планов по техническому перевооружению,
реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электрических сетей
Общества ПАО «МРСК Центра» и задачах на 2020 год»**

С целью обеспечения надежности электроснабжения потребителей ПАО «МРСК Центра» (далее – Общество) в 2019 году реализован ряд мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевого комплекса:

1. Выполнение мероприятий по повышению надежности

В целях повышения надежности в 2019 году реализованы следующие мероприятия:

Наименования программы	ЕИ	План 2019	Факт 2019
Программа по расчистке просек ВЛ 0,4-110 кВ	га	12 025,95	13 013,14
Программа по расширению просек ВЛ 0,4-110 кВ	га	864,54	864,54
Обновление автомобильного транспорта и специальной техники	шт.	389	389

2. Выполнение ремонтной программы ПАО «МРСК Центра».

Наименование работ	ЕИ	План 2019	Факт 2019
1. Ремонт ВЛ -35 кВ и выше в том числе: - капитальный ремонт ВЛ 35-110 кВ - замена грозотроса - замена изоляторов	км км шт.	4 073,5 51,04 121 500	4 151,8 59,80 142 083
2. Ремонт ПС-35 кВ и выше:			
2.1. Ремонт трансформаторов 35 кВ и выше	шт.	31	33
2.2. Ремонт выключателей 6 кВ и выше	шт.	1 328	1 388
2.3. Ремонт ОД, КЗ, разъединителей	шт.	1 223	1 287
3. Ремонт ЛЭП 0,4-10 кВ	км	9 917,19	10 677,44
4. Капитальный ремонт ТП 10/0.4 кВ	шт.	4 182	4 760

3. Новое строительство, техническое перевооружение и реконструкция объектов Общества

Инвестиционной программой Общества на 2019 год предусмотрен объем освоения капитальных вложений в сумме 12 446 млн. руб. без НДС, факт 2019 год – 11 836 млн. руб. без НДС, в том числе:

- техническое перевооружение и реконструкция в 2019 году – 7 997 млн. руб. без НДС, факт 2019 года – 7 387 млн. руб. без НДС;
- новое строительство и расширение в 2019 году – 4 315 млн. руб. без НДС, факт 2019 года – 4 315 млн. руб. без НДС,
- прочие капитальные вложения в 2019 году – 134 млн. руб., факт 2019 года – 134 млн. руб. без НДС.

Ввод основных средств в 2019 году предусмотрен в объеме 11 174 млн. руб. без НДС, факт 2019 года – 11 246 млн. руб. без НДС:

- техническое перевооружение и реконструкция – 7 070 млн. руб. без НДС,

факт 2019 года – 7 142 млн. руб. без НДС;

– новое строительство и расширение – 4 015 млн. руб. без НДС, факт 2019 года – 4 015 млн. руб. без НДС;

– прочие капитальные вложения в 2019 году – 89 млн. руб. без НДС, факт 2019 года – 89 млн.р. без НДС;

Инвестиционной программой на 2019 год предусмотрен ввод линий электропередачи общей протяженностью 3 240 км, факт 2019 года – 3 311 км, в том числе:

– в рамках технического перевооружения и реконструкции – 1 449 км, факт 2019 года – 1 520 км;

– в рамках нового строительства и расширения – 1 774 км, факт 2019 года – 1 774 км;

– прочие капитальные вложения – 17 км, факт 2019 года – 17 км.

Инвестиционной программой на 2019 год предусмотрен ввод трансформаторной мощности 405 МВА, факт 2019 года – 412 МВА в том числе:

– в рамках технического перевооружения и реконструкции 176 МВА, факт 2019 года – 183 МВА;

– в рамках нового строительства и расширения 197 МВА, факт 2019 года – 197 МВА.

– прочие капитальные вложения – 32 МВА, факт 2019 года – 32 МВА

Выполнение мероприятий по реализации приоритетных объектов в 2019 году:

Наименование приоритетного объекта ИП	Объем ввода в физ. ед.	Капитальные вложения млн. руб. без НДС	Основные технико-экономические показатели
Строительство ПС 110/10 кВ Спутник для Техприсоединения ООО Выбор договор №41199851 от 28.03.16; ООО Ремстрой №41210590 от 16.09.16 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 80 МВА)	80	664	для ликвидации дефицита мощности Центра питания


Динамика капитальных вложений (освоение, млн. руб. без НДС):

Освоение КВЛ	2017 факт		2018 факт		2019 план		Факт 2019 года	
	Всего	в т.ч. ТП	Всего	в т.ч. ТП	Всего	в т.ч. ТП	Всего	в т.ч. ТП
Всего ИПР	11 756	5 025	12 230	4 949	12 446	4 688	11 836	4 688
Всего ТП и Р, в т.ч.:	6 756	976	7 974	1 035	7 997	869	7 387	869
ВЛ 35-110 кВ	869	78	781	11	790	2	790	2
КЛ 35-110 кВ	5	-	-	-	-	-	-	-
ВЛ 0,4-20 кВ	1 246	34	1 107	25	1 645	5	1 645	5
КЛ 0,4-20 кВ	156	-	70	-	48	-	48	-
ПС 35-110 кВ	1 639	331	1 539	180	1 371	79	1 371	79
ТП 6-35/0,4 кВ	741	533	940	819	885	782	885	782

Ввод основных фондов (млн. руб. без НДС):

Ввод ОС	2017 факт		2018 факт		2019 план		Факт 2019 года	
	Всего	в т.ч. ТП	Всего	в т.ч. ТП	Всего	в т.ч. ТП	Всего	в т.ч. ТП
Всего ИПР	14 198	6 475	12 702	5 671	11 174	4 187	11 246	4 187
Всего ТПиР, в т.ч.:	7 915	1 313	8 163	1 449	7 070	885	7 142	885
ВЛ 35-110 кВ	916	61	775	44	496	-	496	-
КЛ 35-110 кВ	8	-	3	-	-	-	-	-
ВЛ 0,4-20 кВ	1 342	53	1 052	26	1 722	5	1 722	5
КЛ 0,4-20 кВ	178	-	88	-	46	-	46	-
ПС 35-110 кВ	2 077	398	1 832	515	1 354	76	1 354	76
ТП 6-35/0,4 кВ	1 005	864	886	696	891	804	891	804

Доля капиталовложений в ИПР (динамика), млн. руб. без НДС

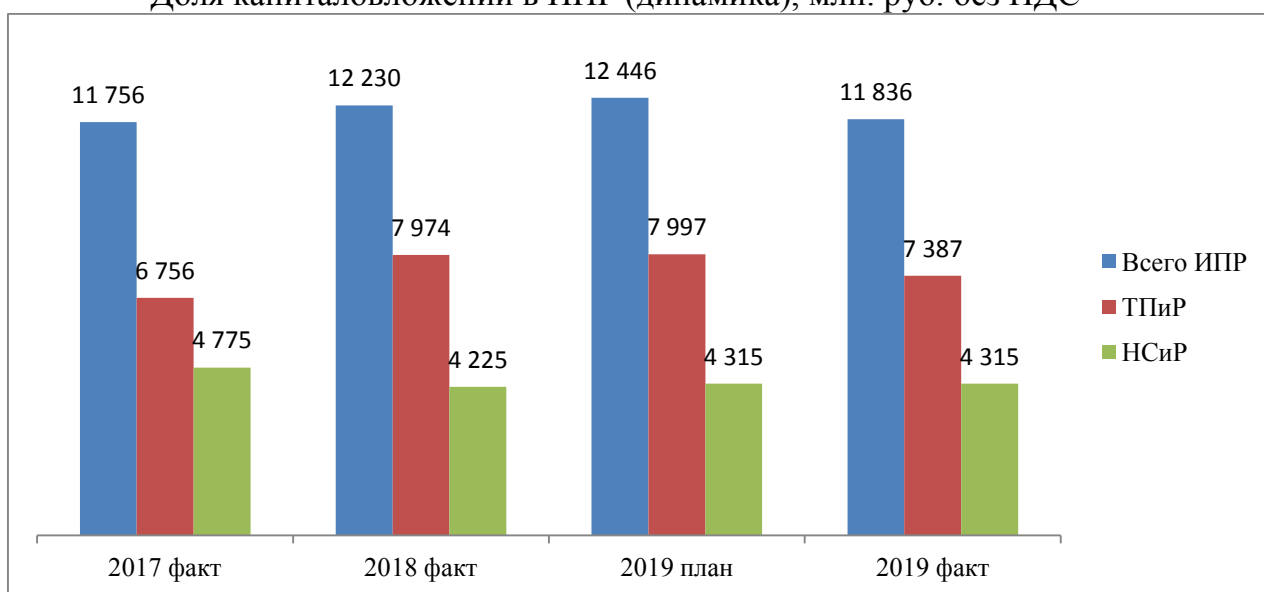

4. Выполнение технического освидетельствования объектов ПАО «МРСК Центра»

В рамках производственной программы ПАО «МРСК Центра», объем работ по техническому освидетельствованию объектов электросетевого хозяйства 0,4 кВ и выше в 2019 выполнен в полном объеме:

Объекты	План 2019	Факт 2019
Линии электропередачи 35 кВ и выше	755	757
Линии электропередачи 0,4-20 кВ	28 282	28 282
Подстанции 35 кВ и выше	585	593
РП, ТП 6-20/0,4 кВ	14 495	14 502
Здания и сооружения (техническое освидетельствование)	1 285	1 285
ВСЕГО	45 402	45 419

5. Выполнение мероприятий по оснащению ПАО «МРСК Центра» необходимыми транспортными средствами

В ПАО «МРСК Центра» действует целевая программа по обновлению автотранспорта и спецтехники: «Программа по комплектации специализированной техникой и автотранспортом».

За 2019 год в соответствии с необходимой потребностью приобретена

автомобильная и специальная техника в следующем объеме:

Филиал	План 2019 года	Факт 2019 года
Белгородэнерго	8	8
Брянскэнерго	55	55
Воронежэнерго	93	93
Костромаэнерго	75	75
Курскэнерго	29	29
Липецкэнерго	0	0
Орелэнерго	9	9
Смоленскэнерго	13	13
Тамбовэнерго	49	49
Тверьэнерго	2	2
Ярэнерго	56	56
ВСЕГО	389	389

6. Выполнение мероприятий по оснащению производственных подразделений необходимыми приборами

За 2019 год в соответствии с потребностью приобретены приборы в следующем объеме:

Тип прибора	План 2019	Факт 2019
Приборы для нужд эксплуатации первичного оборудования и ЛЭП, в т.ч.:	169	169
Тепловизоры	4	4
Приборы для определения загнивания древесины	2	2
Приборы и установки для испытаний и диагностики оборудования	16	16
Приборы и установки для испытаний и диагностики изоляции	15	15
Установки для хроматографического анализа масла	2	2
Осциллографы	5	5
Прочие измерительные приборы	125	125
Приборы и испытательные установки для УРЗА, в т.ч.:	27	27
Ретом-61	3	3
Ретом-21	3	3
Ретометр (М2)	3	3
РЕТ-3000	1	1
Парма-ВАФ	3	3
Мультиметр Mastech MY68N	5	5
Мегаомметр Е6-31	5	5
Мультиметр М-838	4	4

7. Выполнение мероприятий по подготовке персонала ПАО «МРСК Центра».

За 2019 год в соответствии с потребностью обучено:

Направление подготовки	План 2019	Факт 2019
Правила по охране труда, охрана труда при работе на высоте	4 369	4 369
Пожарно-технический минимум	389	389
Промышленная безопасность	696	696
Повышение квалификации электромонтеров	2 374	2 374

Вальщик леса	408	408
Предэкзаменационная подготовка и повышение квалификации персонала ИТР	2 384	2 384
Экологическая безопасность	102	102
Обучение персонала, осуществляющего работы по ремонту распределительных устройств	333	333
Электрогазосварщик	80	80
Повышение квалификации персонала службы метрологии и контроля качества электроэнергии	43	43
Машинист крана автомобильного, машинист автовышки и автогидроподъемника, машинист бурильнокрановой самоходной машины, водитель автопогрузчика	251	251
Инструктор-реаниматор	133	133
Стропальщик	544	544
Защитное вождение, безопасность дорожного движения	3005	3005
Организация оперативного управления электрическими сетями 6-10 и 35-110 кВ	208	208
ВСЕГО	15 319	15 319

8. Задачи ПАО «МРСК Центра» на 2020 год в части повышения надежности объектов электросетевого хозяйства

С целью обеспечения надежности электроснабжения потребителей ПАО «МРСК Центра» (далее – Общество) в 2020 году планируется реализовать мероприятия направленные на повышение надежности функционирования электросетевого комплекса.

№	Наименование работ	ЕИ	Объем выполняемых работ
1	Расширение трасс ВЛ, га	га	760,3
2	Расчистка трасс ВЛ, га	га	13 758,1
3	Ремонт ВЛ -35 кВ и выше в том числе: - капитальный ремонт ВЛ 35-110 кВ - замена грозотроса - замена изоляторов	км шт шт	3 416,5 45,6 128 095
4	Ремонт ПС-35 кВ и выше: - ремонт трансформаторов 35 кВ и выше - ремонт выключателей 6 кВ и выше - ремонт ОД, КЗ, разъединителей	шт шт шт	16 1 374 1 238
5	Ремонт ЛЭП 0,4-10 кВ	км	110,0
6	Капитальный ремонт ТП 10/0.4 кВ	шт	4 131

Первый заместитель
генерального директора –
главный инженер ПАО «МРСК Центра»

А.В. Пилюгин

Заместитель генерального директора
по инвестиционной деятельности

Д.В. Скляр

Начальник ДТПиРОиРОЭХ
ПАО «МРСК Центра»

Р.А. Румянцев
